


## **BRÜCKE HOFSTETTERSTRASSE, NIEDERHASLI** **BRÜCKENINSTANDSETZUNG**

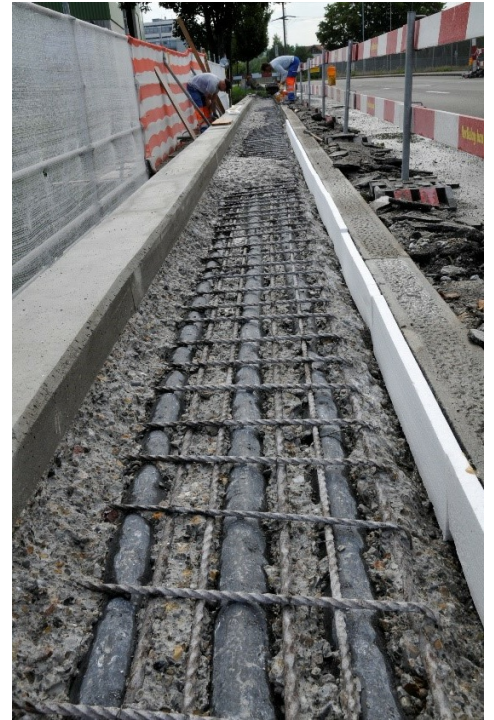

**Bauherr**

Gemeinde Niederhasli

**Bauleitung**

Ingenieurbüro R. Bänziger, Niederhasli  
Werner Erni

**Technische Leitung**

Walter Hofmann

**Bausumme**

CHF 390'000

**Ausführung**

Juni 2009 – November 2009

**Bauführer**

Walter Hofmann

**Poliere**

Betonbau: Rolf Hofer

**Besonderheiten**

1. Brückeninstandsetzung über SBB-Geleise.
2. Grossflächiger Betonabtrag auf der Fahrbahnplatte und Gehweg mit Höchstdruckwasserstrahl.
3. Ausbetonieren abgetragene Flächen mit schnellhärtendem Beton.
4. Aufbetonieren von Konsolkopf und Gehweg.
5. Abdichtung und Gussasphalt auf Fahrbahnplatte und Gehweg.
